

FLEX dopravně inženýrské služby s.r.o., Rosnická, 360 Karlovy Vary-Sedlec
Tel, fax: 353569231, 353569632 OR Plzeň, oddíl C, vložka 7402
E-mail: info@flexkv.cz WWW: flexkv.cz

Návrh dopravního opatření

Stavba: KV, Ostrov, Klášterní p.č. 1448 - nové podzemní vedení kabelu NN
- podélný výkop v ostatních plochách
- překop MK po polovinách, překop chodníku

Realizace: Eplus s.r.o.
Karlovy Vary

Dopravní značení se navrhuje dle příloh s tím, že:

1. podélné výkopy v ostatních plochách budou prováděny s tím, že zbyde pro průchod pěších min. 1,25 metru (použita přechodová lávka - překop chodníku) a po celé délce budou zabezpečeny pomocí zábran Z2, výstražné pásy a vytičovací kolíky.
2. překop MK po polovinách bude prováděn s tím, že zbyde pro průjezd vozidel min. 3 metru a bude po celé délce zabezpečen pomocí směrových desek Z4, zábrany Z2 a SDZ A15 a B21a(30) v kombinaci s B21a.
3. případě potřeby zajistí dodavatel prací krátkodobé ruční řízení provozu pomocí náležitě poučených a vybavených pracovníků - průjezd IZS!!!
4. dopravní značky reflexní, základní velikost
5. vzdálenosti dle TP 66 - II. vydání
6. světla typ 1.

Vyjádření Policie ČR - DI Karlovy Vary:



Zbyněk Morávek
Karlovy Vary 17.5.2022

PČR DI K. VARY DNE 10-06-2022
PŘÍLOHA K ČJ: KRPK-43464/07-2022-190306
LIST: 1/3

por. Bc. Pavel Písařík
komisař DI PČR K. Vary
ČOZ 326115


Městský úřad Ostrov
odbor dopravně správní

9: Město/11820/2023/ODS/LVE
13.7.2023 11/3 Vky 1

Celková situace

Městský úřad Ostrov
odbor dopravně správní

č.j. MěÚO/MP20/2022/025/60E
13.3.2022 2/0 den 1

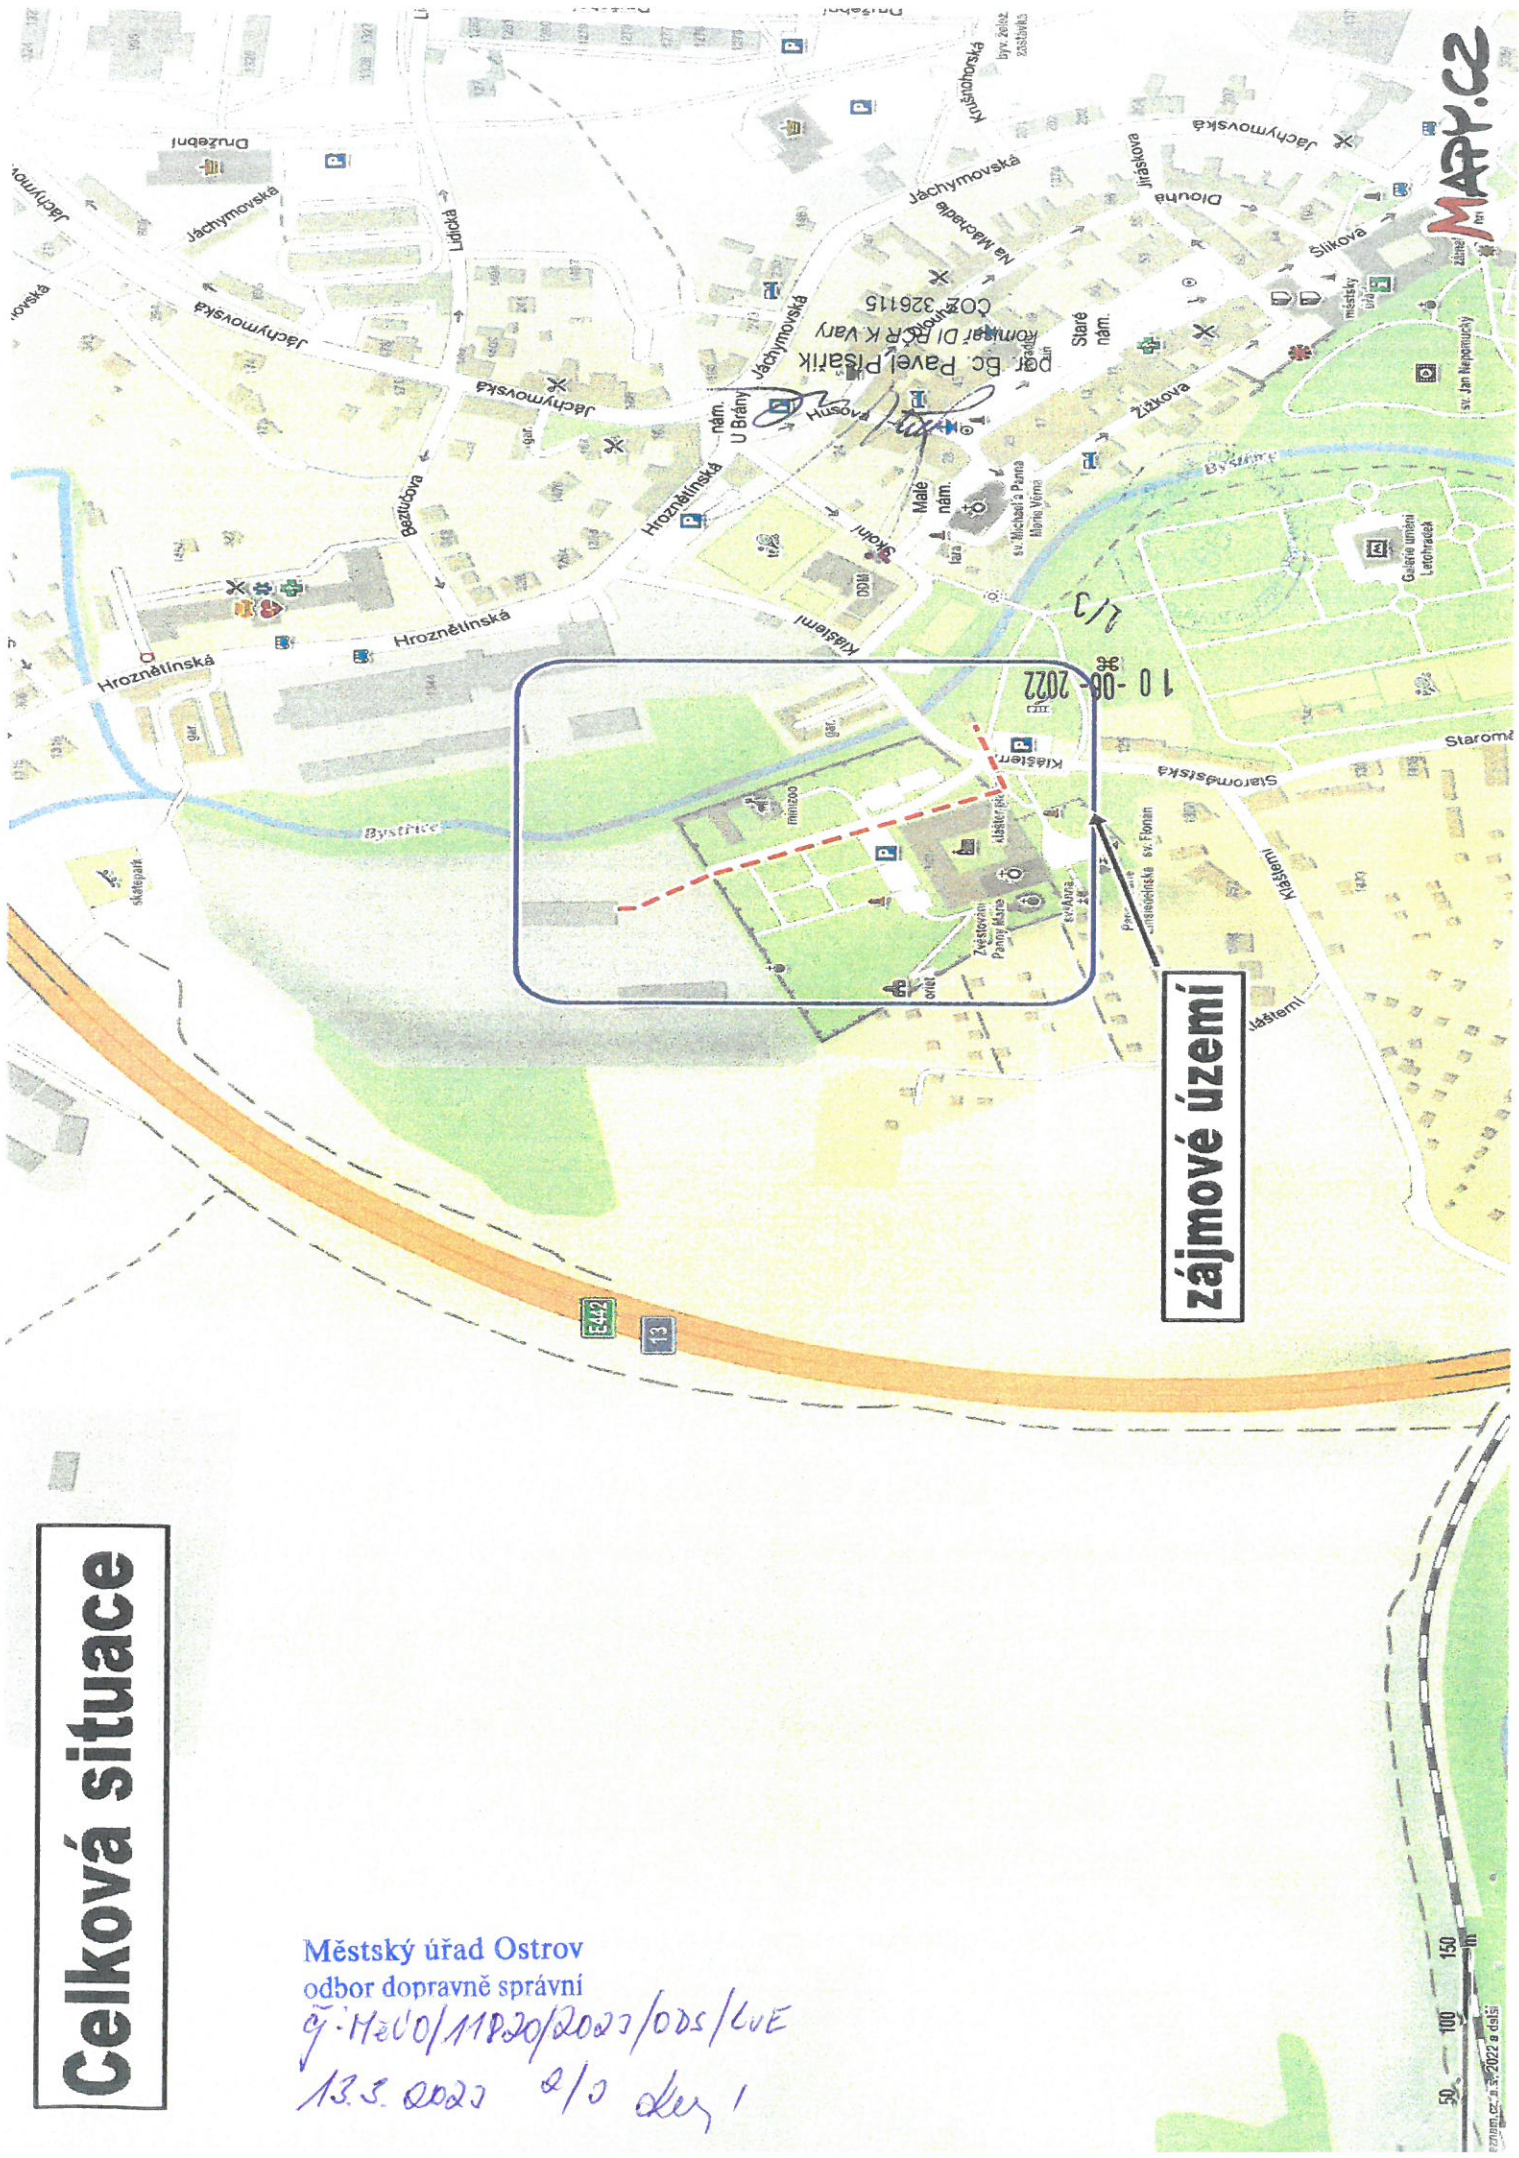


zájmové území

Městský úřad Ostrov
odbor dopravně správní

11.2.2022 / 11.2.2022 / ODC / GVE
13.3.2022 / P. K.

nové podzemní vedení kabelu NN(IV-12-0018156)

výkop mimo komunikaci

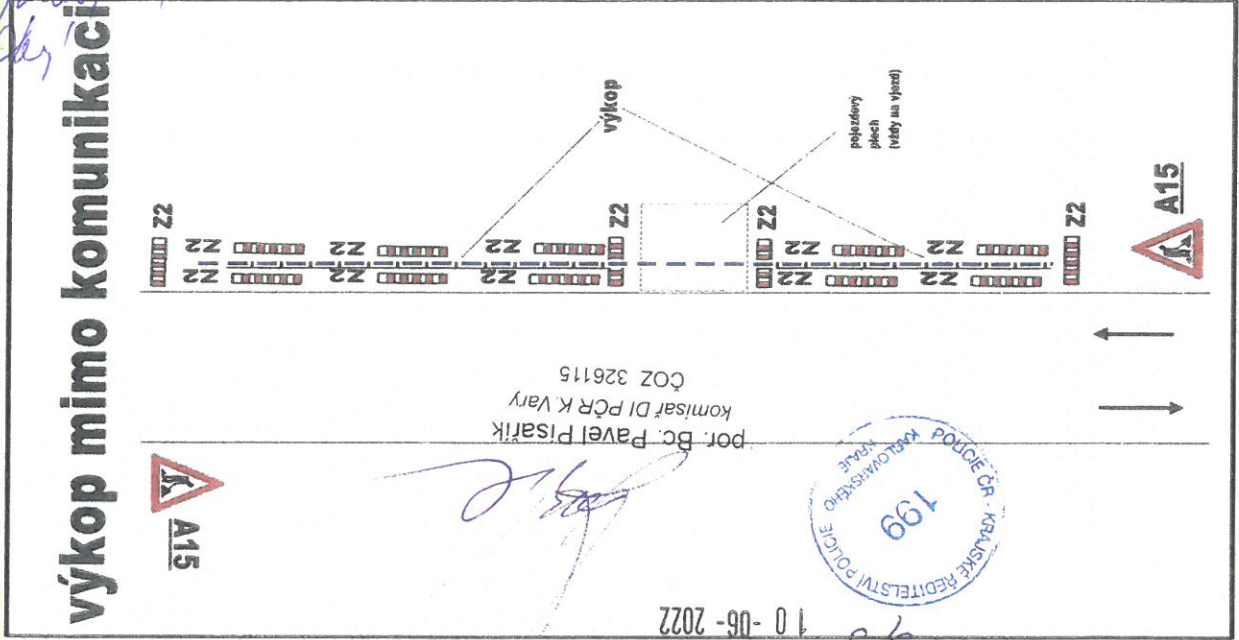

překop po polovinách

