FLEX dopravně inženýrské služby s.r.o..Rosnická 118..360 10 Karlovy Vary
Tel.fax:353569231.353569632 OR Plzeň.oddíl C.vložka 7402
E-mail:info@flexkv.cz WWW:flexkv.cz

Návrh dopravního opatření

Stavba:KV.Jáchymov.Na Slovanech.Ul.Dukelských hrdinů-nové podzemní vedenísítě CETIN
FTTx_SVS_JAKARI

-montážní jámy 1x1 metr(zářuky ve stávající trase)
-protlaky MK a I/25
-podélné výkopy v ost.plochách a kraji MK a chodníku

Realizace:CETIN a.s.
Praha 9

Dopravní značení se navrhuje dle příloh s tím,že:
1.montážní jámy 1 x 1 metr v ost.plochách a chodníku budou po celé délce zabezpečeny pomocí zábran Z2 s dodržením minimálního průchodu 0.9 metru.
2.protlaky MK a I/25 budou prováděny s tím ,že startovací jámy budou mimo těleso komunikace a po celé délce budou zabezpečeny zábranami Z2 a SDZ A15
3.podélně výkopy v ostatních plochách budou po celé délce zabezpečeny pomocí zábran Z2 v chodníku také zábranami Z2 s minimálním průchodem 0.9 metru a v kraji MK směrovými deskami s minimálním průjezdem 2.75 metru.Budou osazeny SDZ A15 v kombinaci s B20a(30).Přes překopané chodníky bude osazena přechodová lávka
4.v případě potřeby zajistí dodavatel prací krátkodobé ruční řízení provozu pomocí náležitě poučených a vybavených pracovníků(průjezd IZS)
5.dopravní značky reflexní.základní velikost
6.vzdálenosti dle TP 66 – II.vydání
7.světla typ 1.

Vyjádření Policie ČR-DI Karlovy Vary:

Zbyněk Morávek
Karlovy Vary 11.3.2024

Městský úřad Ostrov
odbor dopravně správní
Č.j.: MěÚO/26971/2024/ODS/LvE
22.5.2024 1/6 Ok

Celková situace

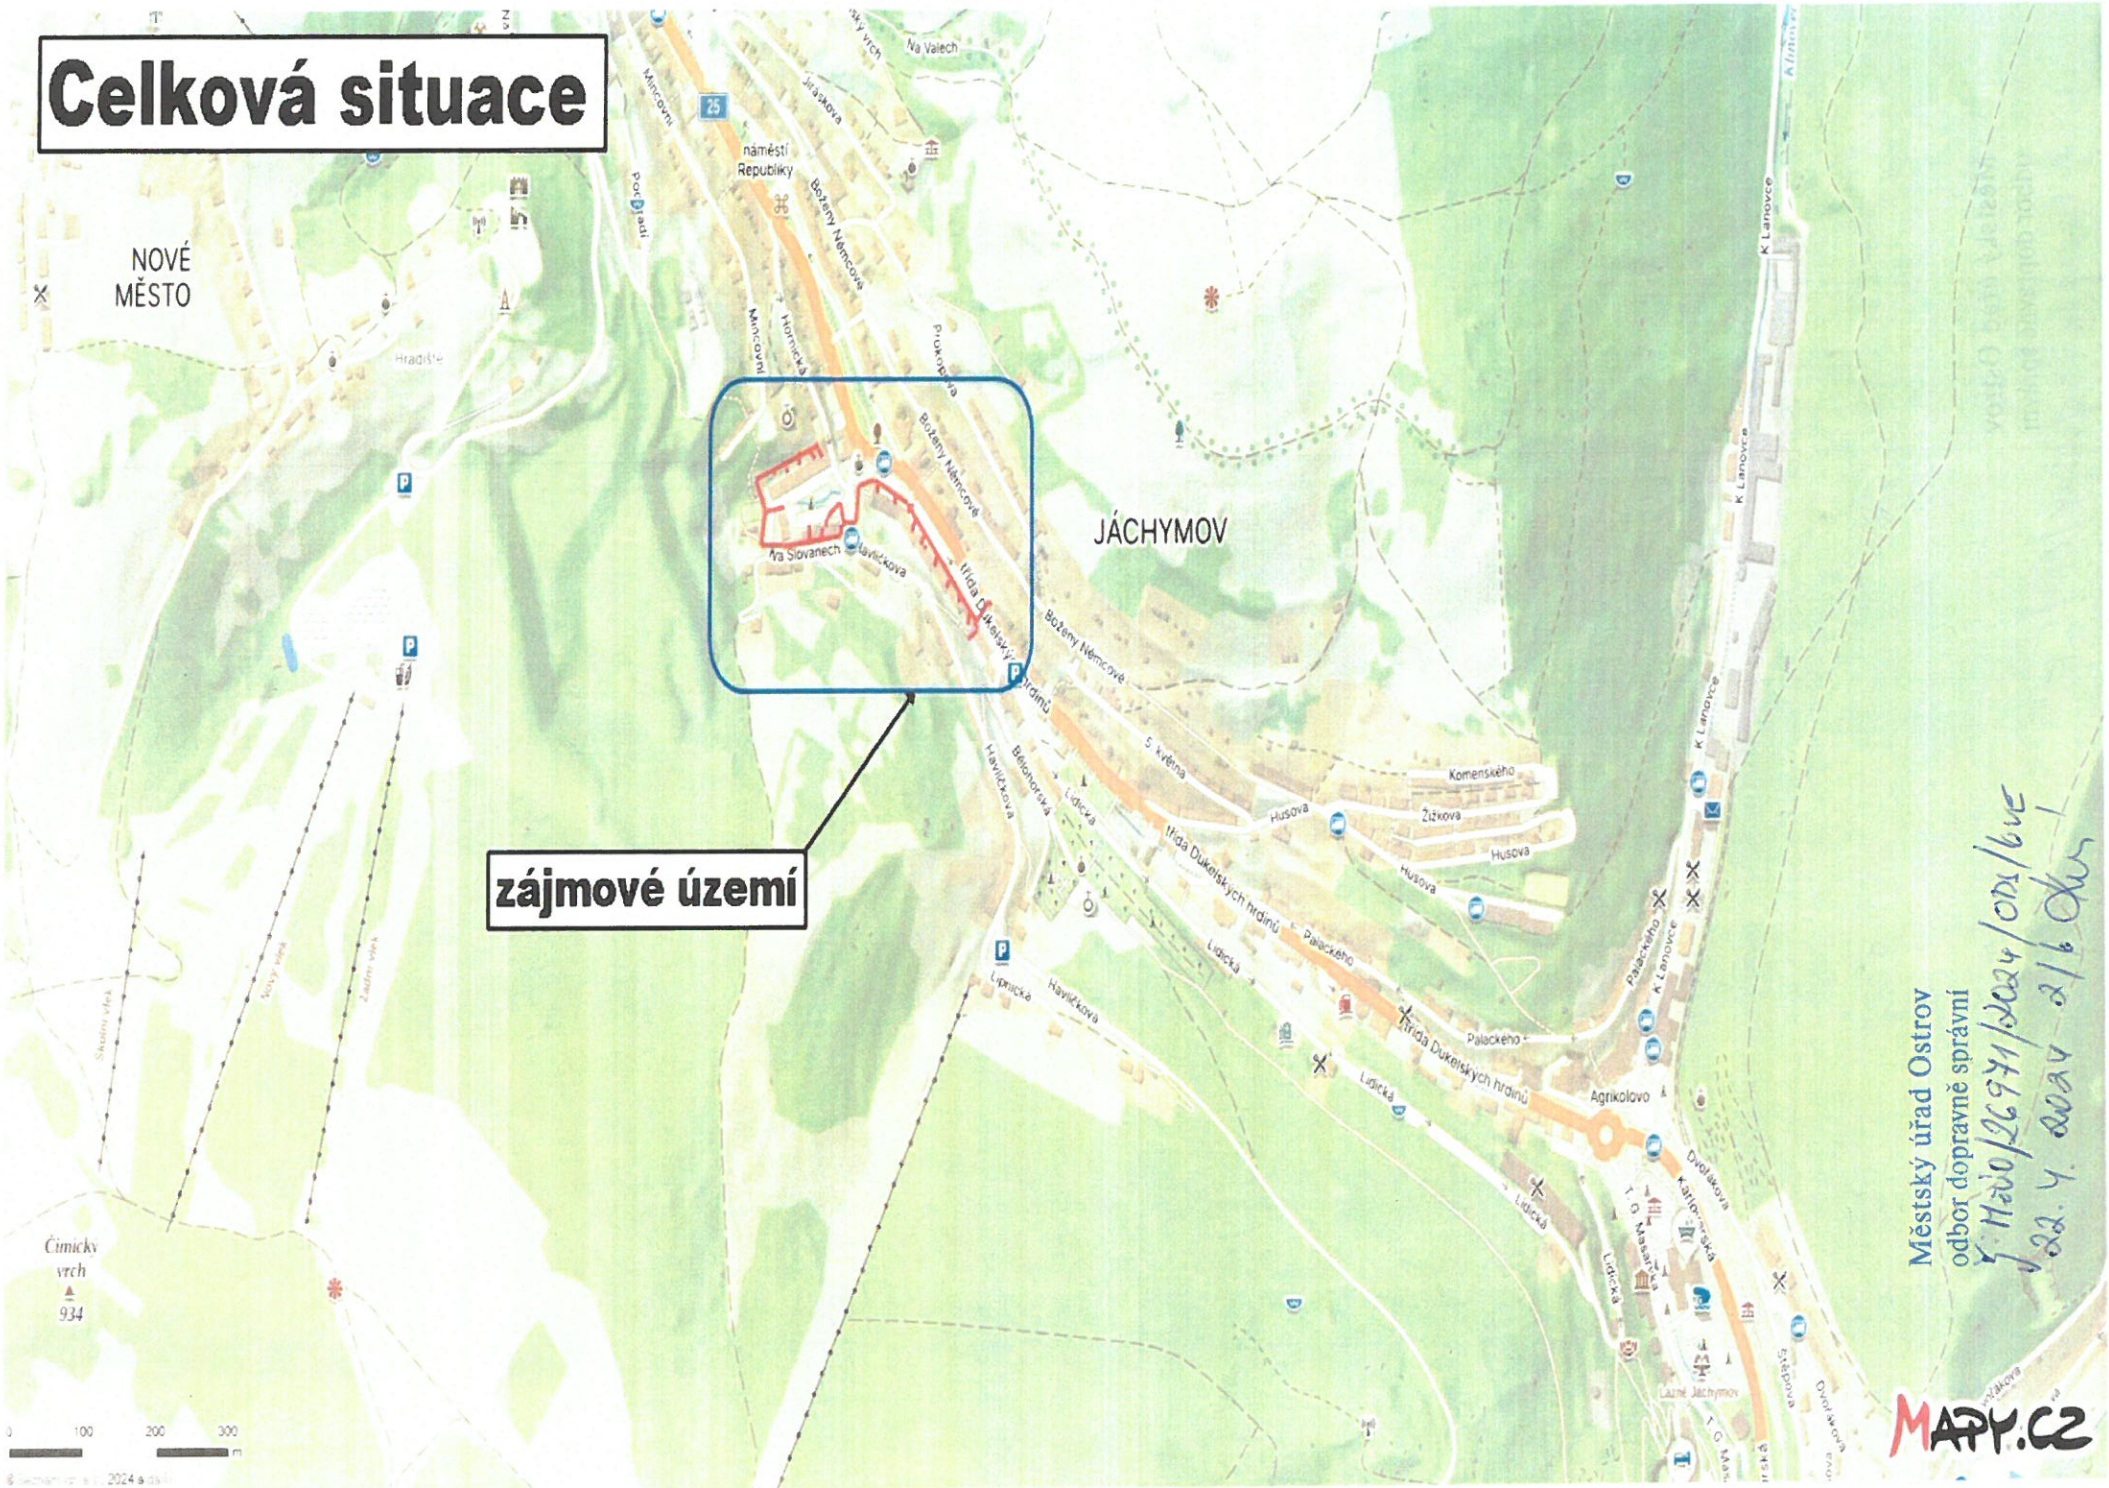

zájmové území

Městský úřad Ostrov
odbor dopravně správní
č.j. MěÚ/26971/2024/ODS/Hvr
ze dne 22.4.2024 - 2 / 6 Dvr

MAPY.CZ
